



广西公司 2025 年巡线便道修建项目(标段二)(华南公司)/(西南管道)

HSE 作业指导书

	签字	职务	日期
编制人:	彭涛	现场负责人	2025 年 10 月 18 日
审核人:	卢海亮	项目经理	2025 年 10 月 18 日
批准人:	司艳会	技术负责人	2025 年 10 月 18 日

河北燕青建工集团有限公司（盖章）

2025 年 10 月 18 日



目 录

第一章、工程概况	1
第二章、组织机构和职责	4
第三章、风险分析及安全技术措施	7
第四章、危害识别与控制	16
第五章、应急计划	17
第六章、附图	3

第一章、工程概况

一、工程概况

2.1 工程名称: 广西公司2025年巡线便道修建项目(标段二)(华南公司)、广西公司2025年巡线便道修建项目(标段二)(西南管道)

2.2 工程地点: 广西百色、邕宁、河池、黎塘、玉林区域

2.3 工程内容: 广西公司管辖管道线路经过山区地段较多且地势陡峭,目前巡线通道多为简易步梯,当遇下雨天,便道湿滑,容易造成人身伤害。此外,部分管段跨越河沟,缺少便桥,涉水存在安全隐患。为了便于巡线人员更好的开展线路巡查,减少打孔盗油风险,提升应急响应速度,进一步保障管道运行安全计划修建巡线便道和便桥,

2.4 工程特点: 野外山区作业,施工条件复杂、限制多,环境影响大,基础设施薄弱,高风险作业集中,安全管控难度大,施工工序关联性强,协同要求高。

二、作业基本信息

序号	项目	内容
1	工程名称	1) 广西公司 2025 年巡线便道修建项目(标段二)(华南公司) 2) 广西公司 2025 年巡线便道修建项目(标段二)(西南管道)
2	甲方(发包人)	1) 国家石油天然气管网集团有限公司华南分公司 2) 国家管网集团西南管道有限责任公司南宁输油气分公司
3	所属单位及涉及数量	巡检便道共计: 33 处、巡检便桥共计: 28 处
		1) 百色作业区共: 24 处(巡检便道 5 处、巡检便桥 19 处)
		2) 邕宁作业区共: 16 处(巡检便道 8 处、巡检便桥 8 处)
		3) 河池作业区共: 12 处(巡检便道 11 处、巡检便桥 1 处)
		4) 黎塘作业区共: 7 处(巡检便道 7 处)
		5) 玉林作业区共: 2 处(巡检便道 2 处)
4	计划工期	2025 年 10 月 1 日起至 2026 年 04 月 30 日止
5	工程地点	广西百色、邕宁、河池、黎塘、玉林区域
6	工程质量	合格,达到设计要求,无质量、安全事故事件发生,符合国家和行业现行有关施工及验收规范。

三、百色、邕宁、河池、黎塘、玉林作业区主要内容及工作量

表4.1 广西分公司2025年巡线便道修建项目百色作业区主要工程量一览表					
序号	工程名称	项目	单位	工程量	备注
1	巡线便道	便道 C20 混凝土	m³	526	踏步暂按 80%计量
		模板面积	m²	469.5	按周转一次考虑
		土方开挖	m³	250.4	
		清表整平	m²	3130	
		平均倒运距离	m	900	
		发电机	台班	85.7	按 10kw 柴油发电机考虑
		管道桩	根	31	按间距 100m 考虑
2	巡线便桥	人工清表	m³	32.4	
		人工开挖	m³	663.4	
		C20 混凝土	m³	2.88	
		C30 板混凝土（P6）	m³	21	
		C30 墩混凝土（P6）	m³	15.19	
		C30 基础混凝土（P6）	m³	3.12	
		浆砌石	m³	6.21	
		不小于 12 钢筋	kg	3052	
		其它钢筋	kg	701	
		钢材	kg	1666	
		木模板（桥板）	m²	123.4	
		木模板（基础）	m²	58.3	
		抽水泵（台班）	个	4	
		发电机（台班）	个	4	
		黏土围堰	m³	52	
		二次搬运	m	180	
3	占地补偿		亩	3.8	
4	青苗赔偿		项	1	
注：实际工程量以签字验收收方工程量为准。					

表4.1 广西分公司2025年巡线便道修建项目邕宁作业区主要工程量一览表

序号	工程名称	项目	单位	工程量	备注
1	巡线便道	便道 C20 混凝土	m ³	302.5	踏步暂按 80%计量
		模板面积	m ²	270	按周转一次考虑
		土方开挖	m ³	144	
		清表整平	m ²	1800	
		平均倒运距离	m	300	
		发电机	台班	50	按 10kw 柴油发电机考虑
		管道桩	根	18	按间距 100m 考虑
2	巡线便桥	人工清表	m ³	15	
		人工开挖	m ³	168.9	
		C20 混凝土	m ³	4.32	
		C30 板混凝土 (P6)	m ³	12.58	
		C30 墩混凝土 (P6)	m ³	25.37	
		C30 基础混凝土 (P6)	m ³	9.36	
		不小于 12 钢筋	kg	2734.8	
		其他钢筋	kg	781.2	
		钢材	kg	1675.8	
		木模板 (桥板)	m ²	75.5	
		木模板 (基础)	m ²	69.76	
		抽水泵 (台班)	个	6	
		发电机 (台班)	个	6	
		黏土围堰	m ³	97	
		二次搬运	m	250	
3	占地补偿		亩	2.2	
4	青苗赔偿		项	1	

注：实际工程量以签字验收收方工程量为准。

表4.1 广西分公司2025年巡线便道修建项目河池作业区主要工程量一览表

序号	工程名称	项目	单位	工程量	备注
1	巡线便道	便道 C20 混凝土	m ³	366.3	踏步暂按 80%计量
		模板面积	m ²	327	按周转一次考虑
		土方开挖	m ³	174.4	
		清表整平	m ²	2180	
		平均倒运距离	m	200	
		发电机	台班	60	按 10kw 柴油发电机考虑
		管道桩	根	21	按间距 100m 考虑
2	巡线便桥	人工清表	m ³	6	
		人工开挖	m ³	67	
		C20 混凝土	m ³	2	
		C30 混凝土 (P6) 桥板	m ³	3.75	
		浆砌石	m ³	24	
		不小于 12 钢筋	kg	576	
		木模板 (桥板)	m ²	12.2	
		发电机 (台班)	个	2	
		二次搬运	m	150	
3	占地补偿		亩	2.7	
4	青苗赔偿		项	1	

注：实际工程量以签字验收收方工程量为准。

表4.1 广西分公司2025年巡线便道修建项目黎塘作业区主要工程量一览表

序号	工程名称	项目	单位	工程量	备注
1	巡线便道	便道 C20 混凝土	m ³	740	踏步暂按 80%计量
		截水沟 C25 混凝土	m ³	16.5	黎塘作业区修建截水沟
		模板面积	m ²	660	按周转一次考虑
		土方开挖	m ³	352	
		清表整平	m ²	6200	
		平均倒运距离	m	310	
		发电机	台班	120	按 10kw 柴油发电机考虑
		管道桩	根	44	按间距 100m 考虑
2	占地补偿		亩	5.3	
3	青苗赔偿		项	1	

注：实际工程量以签字验收收方工程量为准。


表4.1 广西分公司2025年巡线便道修建项目玉林作业区主要工程量一览表

序号	工程名称	项目	单位	工程量	备注
1	巡线便道	便道 C20 混凝土	m ³	840	踏步暂按 80%计量
		模板面积	m ²	750	按周转一次考虑
		土方开挖	m ³	410	
		清表整平	m ²	5000	
		平均倒运距离	m	410	
		发电机	台班	137	按 10kw 柴油发电机考虑
		管道桩	根	50	按间距 100m 考虑
2	占地补偿		亩	6.0	
3	青苗赔偿		项	1	

注：实际工程量以签字验收收方工程量为准。

第二章、组织机构和职责

一、组织机构

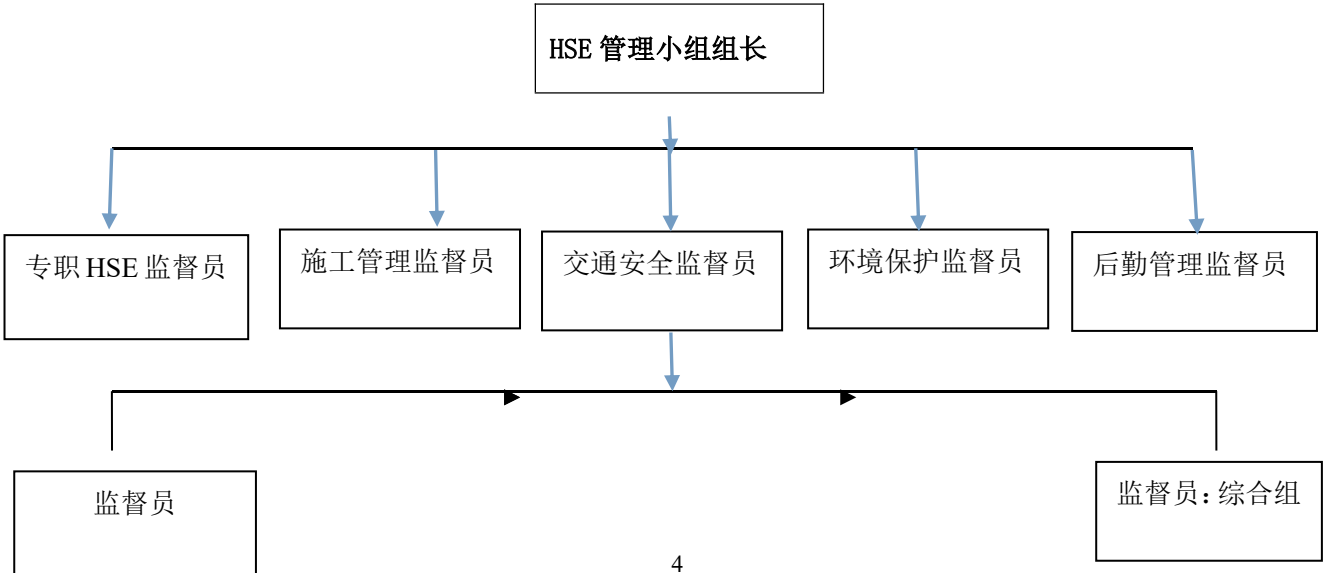

二、职责：

(1) HSE 领导小组组长职责

组长是该项目 HSE 管理第一负责人，负责贯彻国家、地方、行业有关 HSE 的事实，每半月对 HSE 工作全面检查，负责对检查出的隐患进行监督整改，确保 HSE 工作良好运行。

(2) 专职 HSE 监督员职责在领导小组的领导下，负责本工程 HSE 日常管理工作中对，对施工现场进行日常巡回检查，及时查 HSE 隐患，填写 HSE 日常检查记录，负责事故的调查和处理，负责全员的日常安全教育，确保 HSE 管理工作的正常运行。

(3) 施工管理监督员的职责

熟知现场各工序、各工作中、作业中潜在的 HSE 风险因素，在施工工随时检查提醒操作人员有目的的进行现场预防，负责 HSE 风险削减措施的组织落实，负责施工现场的 HSE 隐患检查的整改，负责班组 HSE 工作的正常运转。

(4) 环境保护监督员的职责

负责施工区域内生态环境的保护及施工后地貌恢复工作，并负责环境污染事故的调查和处理工作。

(5) 施工小组监督员的职责

督促小组成员执行 HSE 的管理制度，及时向上级反映现场 HSE 的实施情况，定期维护和保养本小组负责的设备和设施。

三、各岗位责任人职责

序号	职务	姓名	职责	联系电话	备注
1	项目经理	卢海亮	1)对本项目的安全管理工作总体负责发生异常事故时负责全局指挥。 2) 现场施工作业直接管理责任人。	1341245263	
2	技术负责人	司艳会	1) 技术资料的收集和整理； 2) 全面负责本工程技术、组织施工技术方案编制； 3) 对实施人员进行技术交底； 4) 组织竣工报告的编制等工作； 5) 负责施工过程中技术指导及解决疑难问题。	13832432566	
3	质量员	赵艳辉	1) 负责各工序质量的抽查。协助项目经理	1868903475	

序号	职务	姓名	职责	联系电话	备注
			和项目总工程师做好详细的质量技术方案的编制工作； 熟悉施工程序，技术规范，质量标准 and 操作规程； 2) 对施工现场能进行有效质量控制，做好施工前质量技术交底工作，能处理施工现场中出现的一般质量问题；严格按照有关规定做好质量资料的整理和上报工作。		
4	安全员	笪丽伟	1) 负责本工程安全管理，对施工过程中安全检查 ， 监控； 2) 对项目安全、健康、环保、安保工作进行技术交底； 3) 向项目经理和公司安全部门汇报安全管理工作； 4) 对违规作业进行处罚并督促整改。	15653478484	

四、安全知识基础培训

- (1) 学习企业所在当地政府有关健康、安全、与环境方面的法律、法规、政策及标准。
- (2) 本企业健康、安全、与环境方针、目标、规定和要求。一般安全知识与环保知识。
- (3) 人员自救、急救和人身防护常识。
- (4) 减少、收集和处理废弃物的方法。

五、应急措施与求生技术的培训

- (1) 消防器材、报警装置、求助、急救等设备的使用方法。
- (2) 预防爆炸、火灾报警呼救、撤离及救灾的知识。
- (3) 预防有毒气体、窒息措施，预防污染事故的发生。

第三章、风险分析及安全技术措施

一、施工现场危险源识别及消减措施

过程和活动	风险因素	危害和影响	消减措施
进场准备 人员管理	1. 因无证上岗、违反操作规程、违章指挥、违章作业、违反劳动纪律及管理原因。	1. 人身伤害 2. 污染环境 3. 损坏设备 4. 影响生产	1. 人员证件上岗制度、培训考试制度； 2. 巡查制度。
设备管理	1. 由于设备和设施不安全、劳动条件和作业环境不良或危险、工艺方法或流程瑕疵、管理不善所发生的。	1. 人身伤害 2. 污染环境 3. 损坏设备 4. 影响生产	1. 设备保养、设备检查、设备合格证、设备检验制度； 2. 人员设备培训。
施工过程 机械伤害、 物体砸伤、 碰伤	1. 未佩戴安全帽，劳保用品； 2. 违章操作设备、违章使用工具。	1. 人员伤亡 2. 设备损坏	1. 进入作业现场必须佩戴安全帽； 2. 禁止从高处投扔工具； 3. 严格按照操作说明使用设备和工具。
人员跌落、 高处坠落	1. 施工现场无明显标志，防护设施缺失或不规范 2. 员工安全意识不强 3. 管理与监测缺失 4. 未按要求施工	1. 人员伤亡事故 2. 工程延误 3. 责任追究与信誉损失	1. 严格执行方案要求施工； 2. 全程施工作业做好防护措施，安全培训交底，监护到位。
火灾	1. 吸烟及携带火种 2. 劳保服装及工鞋不合格	1. 人员伤害 2. 设备损坏	1. 禁止吸烟，携带火种。 2. 配备符合要求的劳动保护用品， 3. 配备符合要求的防爆工具。

第四章、应急预案

一、应急组织机构

1、现场应急指挥

基本职责。根据突发事件的进展、相关工作预案和领导指示，组织指挥参与现场救援的各单位，迅速控制局势，力争把损失降到最低限度；组织公安、交通等部门和属地政府做好现场管控、交通保障、人员疏散和安置工作；协调各相关部门和单位，做好调查、善后工作，防止出现次生、衍生灾害，尽快恢复正常秩序；及时向上一级应急指挥机构报告重要信息，及时向有关单位通报情况。

核心要素。包括设立指挥场所、提供办公设备和现场标识管理。根据突发事件的性质、种类、危害程度或实际需要，按照“安全就近、方便指挥”的原则，在灾害事故现场周边适当的位置或指挥通信车辆上设立指挥场所，包含办公、集结、新闻采访和新闻发布等区域。场所内应有办公桌椅、电话传真、电脑、打印机等基本办公设备，应具备召开会商会议的能力。按照“方便辨识、位置醒目”的原则，及时发放各种标识，禁止无关人员和车辆进出现场，确保现场秩序。

2、项目部HSE监督：

坚持按期开展各种形式的安全、环境与健康检查，检查应有重点，针对性强，以提高检查效果。按制定的检查标准和检查范围逐项检查，防止随意性。在项目部HSE检查过程中，不断改善提高HSE水平、

3、应急小组：

负责事故现场的应急指挥工作，进行应急任务分配和人员调度，有效利用各种资源，保证在最短时间内完成事故的应急行动。

4、项目部应急指挥及救援组织机构

项目部安全领导小组	事故现场抢险组
	事故现场救护组
	后勤工作组

5、项目部安全小组机构组成

项目部安全领导小组		
组长	卢海亮	总指挥副组长负责指挥处理紧急情况的全面工作
事故抢救小组		
组员	司艳会	负责日常执行抢救工作
事故救护组		
组员	笪丽伟	负责执行救护工作
后勤工作组		
组员	赵艳辉	负责发放救援物资


6、应急机构联络电话

单位	姓名（部门）	职务	地址	联系电话
上级应急救援组织				
广西分公司	唐水源	项目负责人	南宁良庆区富德广场	18169681420
百色作业区	蒙俊锋	管道副主任	广西百色	13517765617
邕宁作业区	袁业盛	管道副主任	广西邕宁	177776008461
河池作业区	孙常龙	管道副主任	广西河池	17776671177
黎塘作业区	马玉宝	管道副主任	广西黎塘	18977194765
玉林作业区	张越龙	管道副主任	广西玉林	18107719621
外部依托				
各地人民医院	医疗急救	政府部门	以现场实地地为准	120
各地消防支队	火灾报警	政府部门	以现场实地地为准	119
各地派出所	紧急求援	政府部门	以现场实地地为准	110
其它				

河北燕青建工集团有限公司	卢海亮	项目经理	广西南宁	1341245263
河北燕青建工集团有限公司	司艳会	技术负责人	广西南宁	13832432566
河北燕青建工集团有限公司	笪丽伟	安全员	广西南宁	15653478484

二、应急响应程序

1、应急响应程序

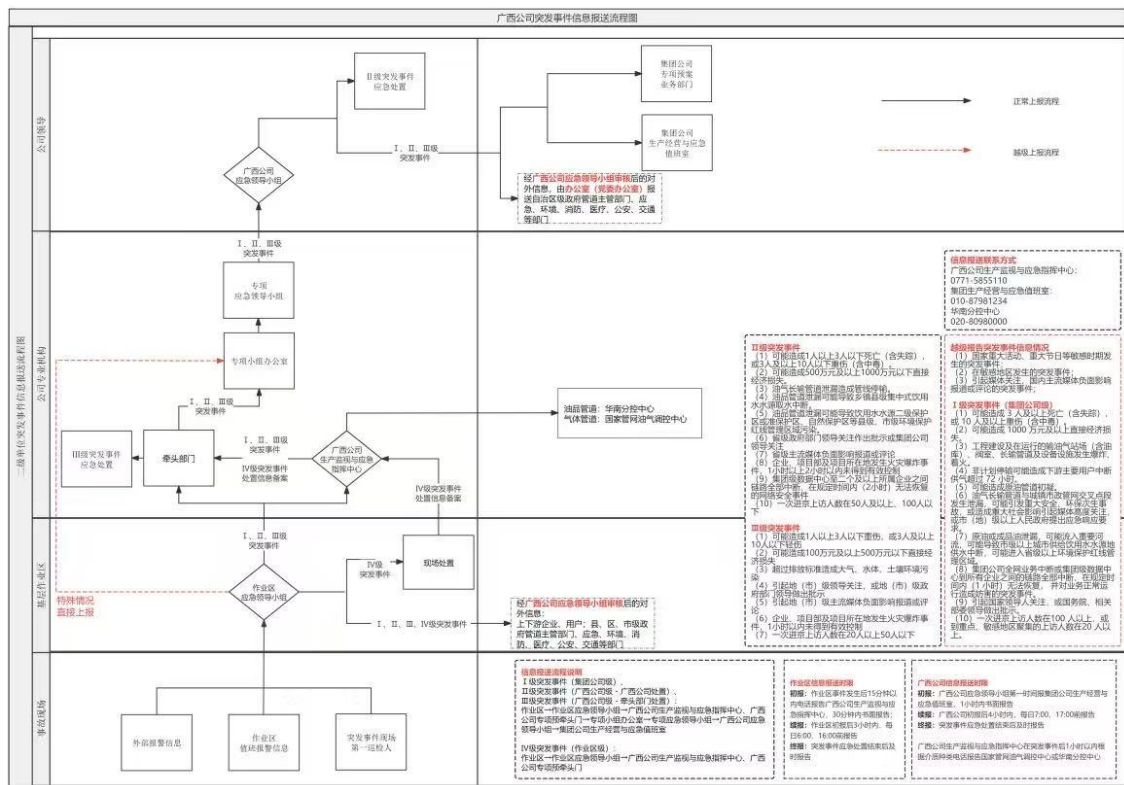

如发生突发事件，按照广西公司的汇报流程配合做好各项应急工作。

2、应急联络

参与项目施工作业的任何人员发现紧急情况必须首先报告施工现场应急领导小组或应急指挥，应急指挥判断事态，应当视灾害的规模、状态、人员伤亡情况，立即采取自救或同施工当地急救中心、医院、消防队等相关部门联系，请求支援。

三、施工中可能出现的风险及防控措施

(1) 便道选址勘察风险

1) 高处坠落、滑倒摔伤或地质灾害导致人员受伤, 防控措施: a 勘察人员配备防滑鞋、安全帽、安全带; 提前研判地质和天气, 雨天或地质风险高时暂停勘察; b. 设置专人监护, 携带应急通讯设备; c. 作业区域必须设立警示隔离区域并专人负责检查、悬挂安全警示标志、标识; d. 严禁无关人员进入作业区域。

2) 工器具质量不合格导致人员伤害、设备损坏, 防控措施: a 正确穿戴劳保着装, 保持施工现场秩序, 工器具有序摆放; b 对进场工器具、设备设施进行外观、产品合格证书检查。

(2) 施工材料运输风险及防控措施

1) 车辆侧翻、材料掉落、交通事故导致人员伤害、材料损坏; 防控措施: a 选用具备山区运输资质的车辆和驾驶员; b 材料采用专用固定装置捆扎牢固, 超限材料办理运输许可; c 运输时控制车速, 设置警示标识, 保持车距。

(3) 便道基础开挖风险及防控措施

1) 工器具使用不当造成机械伤害导致人员伤害、设备损坏; 防控措施: a 正确穿戴劳保着装, 保持施工现场秩序, 工器具有序摆放。b 按照操作规程使用工器具; c 开挖过程中避开人个人一起近距离施工, 防止工具伤人。

(4) 便道主体施工(硬化、浇筑等) 风险及防控措施

(1) 高处坠落、粉尘污染导致人员伤害; 防控措施: a 高处作业人员系安全带, 设置安全网; b 现场配备除尘设备, 作业人员佩戴防尘口罩。

(5) 便桥搭建风险及防控措施

1) 溺水、起重伤害导致人员伤害; 防控措施: a 作业人员穿戴救生衣; b 起重设备经检验合格, 操作人员持证上岗, 严格执行起重操作规程; c 便桥搭建前进行结构验算, 施工中全程监测结构稳定性。

(6) 施工收尾与现场清理风险及防控措施

1) 物体打击、环境污染导致人员伤害、环境污染; 防控措施: a 及时清理现场材料和垃圾, 分类存放并规范处置; b 施工废水经沉淀处理后排放, 建筑垃圾运至指定消纳点。

四、野外施工常见风险急救措施

(1) 着火应急措施

1) 作业人员发现起火, 应立即呼救, 通知现场负责人。

2) 现场全体人员听到呼救后, 要立即停止一切工作视火灾大小与燃烧的程度前往救援。

。

- 3) 灭火时不能慌乱，要统一服从施工现场领导指挥。
- 4) 要准确判断起火部位，迅速切断该区域的油、气、电。
- 5) 若起火致柏积小，要迅速有组织的用灭火器、水、水湿的毛毡、衣服扑灭。
- 6) 若大面积起火或预测到火灾会迅速发展，不易扑灭，应立即拨打119 向消防部门报警。
- 7) 采取措施有组织的隔离或消除附近的易燃易爆、有至物品和机械设备，把它们转移到上风或远离。
- 8) 若有浓烟和有至气体，要用湿毛巾或防至面具捂住口鼻，保护呼吸。
- 9) 抢救顺序是先人后物，先贵后廉。同时要防止二次伤害。

(2) 工具伤害急应急措施：

- 1) 发现有人被工具割伤或打击中时，应立刻停止工具作业，电动工具则马上切断电源。
- 2) 紧按伤口，撤离出作业坑，呼救救护人员进行应急救治。如电源控制器较远，应就近使用木、竹等绝缘具器给触电者切断电源。雨天气要采取措施防止再次触电。
- 3) 现场救护人员应立刻取得应急药品到达伤员处进行伤口包扎、消毒、止血，防止伤口感染。
- 4) 急救处理后立即安排车辆将伤者送到附近的医院施教。

(3) 蛇虫叮咬应急措施：

- 1) 撤离：让伤者缓慢、平静地远离蛇虫，避免再次被咬。
- 2) 让伤者保持安静。避免任何不必要的活动，以减缓毒素随血液扩散的速度，最好采取坐位或卧位。
- 3) 清洁伤口(如果案件允许且安全)：用清水和肥皂(如有)轻轻冲洗伤口。不要用力擦洗。
- 4) 注意观察被叮咬的毒蛇和毒虫种类，告知医生进行对症下药。
- 5) 立即拨打急救电话(如120)或安排交通工具尽快送医。告知是毒蛇或毒虫咬伤。
- 6) 禁止切割伤口，禁止用嘴吸吮。

五、防汛应急措施：

做好汛期的施工安排，对保证本工程以后的施工进度和质量有着重大的影响，为保证工期，汛期施工以预防为主，采用防御措施及加强排水手段，适时地调整工序施工确保汛期正常的施工生产。

现场成立以项目经理为首的汛期施工领导小组，负责组织实施汛期施工的各项质

量保证措施，首先全面地调查施工现场的地势，调查天然排水系统及原有的排水管道等泄水能力，并走访沿线村庄居民、工厂及机关，以便研究制定汛期排水方案，然后根据以上调查情况认真编制汛期施工方案，报监理工程师审批后组织施工人员学习，确保每个工序按标准、规范规程和技术措施组织施工。

设专人值班接收天气预报，及时了解天气情况，做好防范工作。

与当地政府有关部门密切联系，疏通现有排水系统，保证排水通畅。

如发生意外应做出如下处置：

(1) 立即组织营救受害人员，组织撤离或者采取其他措施保护危险区域内的其他人员。抢救受害人员是应急救援的首要任务，在应急救援行动中，快速、有序、有效地实施现场急救与安全转送伤员是降低伤亡率、减少事故损失的关键。由于重大事故发生突然、扩散迅速、涉及范围广、危害大，应及时教育和组织公认采取各种措施进行自身防护，必要时迅速撤离危险区或可能受到危害的区域。在撤离过程中，应积极组织职工开展自救和互救工作。迅速控制事态，并对洪灾事故造成的危害进行检测、监测、测定事故的危害区域、危害性质及危害程度。及时控制住造成洪灾事故的危害源是应急救援工作的重要任务，只有及时地控制住危险源，防止事故的继续扩展，才能及时有效进行救援。发生洪灾事故，应尽快组织义务防汛队与救援人员一起及时控制事故的继续扩展，才能及时有效进行救援。发生洪灾事故，应尽快组织义务防汛队与救援人员一起及时控制事故继续扩展。

(2) 消除危害后果，做好现场恢复。针对事故和人体、土壤、空气等造成的现实危害和可能的危害，迅速采取封闭、隔离、洗消、检测等措施，防止对人的继续危害和对环境的污染。及时清理废墟和恢复基本设施。将事故现场恢复至相对稳定的基本状态。

(3) 查清事故原因，评估危害程度。事故发生后应及时调查事故发生的原因和事故性质，评估出事故的危害范围和危险程度，查明人员伤亡情况，做好事故调查。

(4) 定期组织预案的演练，提高处置突发事件的水平。及时开展应急知识的宣传教育，增强防范意识和应对能力；通过宣传讲座、教育片宣传等方式，队员工宣传工地防汛、抢险法律法规和有关规定，提高防汛意识。有计划地组织防汛抢险队进行《预案》实际演练，提高实际操作技能。

六、应急联络通信录

职务	岗位	职责
----	----	----

组长	项目经理	总指挥，负责启动应急预案，协调外部救援
副组长	技术负责人	现场指挥，组织救援人员，控制事故扩大
成员	现场负责人	负责现场作业人员撤离、受伤人员初步救治
成员	安全员	负责应急物资调配、事故记录与上报
成员	医护兼职人员	负责伤员止血、包扎、心肺复苏等初步处理

七、主要 HSE 设备及用品

7.1 主要 HSE 施工设备机具配置情况

序号	名称	型号规格	数量	备注
一	机械设备			
1	汽油机水泵	JHWP50S	1	
2	切割机	Z1E-FF06-110	1	
3	锂电振动棒	25#	1	
4	工程车	本田/长安	3	
二	施工工具			
1	铁锹、铁铲、铁抹子	/	若干	
2	手推灰车	/	2 台	
三	安全物资			
1	警示带	100m/盘	5 盘	
2	灭火器	干粉 8GK	2 台	
3	安全带	/	2 套	
四	标准化施工现场			
1	安全标志牌	200*160mm	2 套	
2	可移动防雨篷	2*2*4m	2 套	
五	应急物资			

1	应急车		1 辆	
2	医用药箱	/	1 套	配备相关药品
3	防虫驱蚊等药品	/	2 瓶	
4	灭火器	干粉 8GK	2 个	
5	铁铲		2 把	
6	铁锹		1 把	
7	安全警示带		1 卷	
8	雨衣		2 件	
9	雨鞋		2 双	
七	环保物资			
1	现场废旧垃圾回收箱	/	1 只	
2	密目式防尘网	/	300 m²	


7.2 HSE 应急物资配置计划一览表

序号	名称	规格	生产日期	有效日期	备注
1	复方对乙氨基酚片	10 片*1 板	2023. 07. 15	2028. 07. 14	
2	碘酊消毒液	20ml	2024. 12. 06	2026. 12. 05	
3	云南白药气雾剂	50 克	2024. 11. 05	2027. 10. 01	
4	医用棉签	50 支	2024. 02. 01	2027. 02. 01	
5	医用纱布	2 卷/袋	2024. 06. 05	2027. 06. 05	
6	过氧化氢消毒液	100mL	2023. 11. 28	2025. 11. 28	
7	创口贴	20 片	2025. 03. 01	2028. 03. 01	
8	霍香正气水	10 支	2025. 05. 29	2027. 05. 28	
9	季德胜蛇药片	15 片/2 盒	2024. 05. 20	2027. 04. 01	

序号	名称	规格	生产日期	有效日期	备注
10	速心救心丸	180 丸	2024. 10. 19	2027. 09. 01	
11	肠胃宁片	45 片	2023. 06. 09	2026. 05. 01	
12	跌打万花油	25ml	2024. 11. 07	2027. 04. 01	
14	复方倍氯米松樟脑乳膏	10 克	2025. 02. 15	2028. 01. 01	
15	温度计	1 支	/	/	

第四章、危害识别与控制

项目部在开工前对作业全过程中的危害进行识别，对识别出的主要危害进行评价，制定相应的控制和削减措施，分配关键任务，使危害降低到“合理实际并尽可能低”的水平。

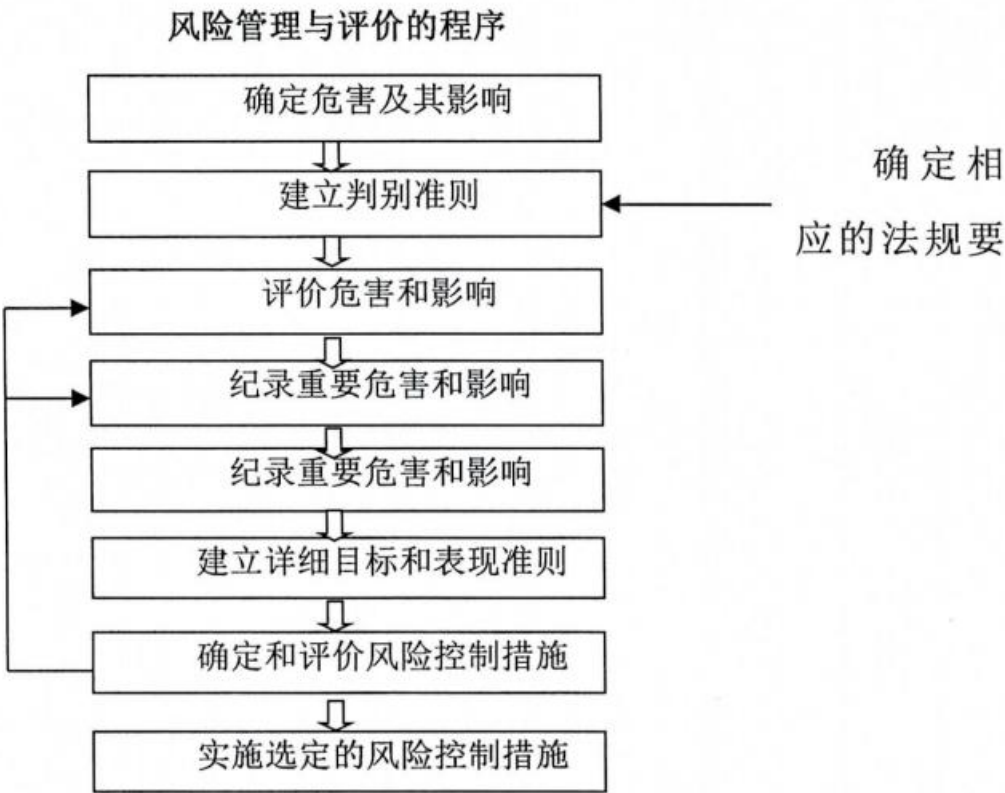

1、危害识别

项目部根据施工现场的自然环境，施工中采用的施工工艺、设备、设施、组织机构、资源条件及其活动、产品和服务的所有方面，按照施工工序中人、机、料、法、环五个方面，从人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不安全因素、管理上的缺陷等全面分析，识别、确定出对项目健康、安全、环境可能造成的危害和影响。

本项目工程的危害识别不仅局限于项目施工作业过程的本身，还扩展到周边社会影响，以有施工所在地的地理、环境、气候等外在因素对安全健康等方面的影响情况。项目部每位员工都有责任参加本岗位及其相关岗位的危害识别活动，这样才能最大限度地保证不漏掉可能的危害因素。

2、风险评价及控制

2.1 风险评价

2.1.1 施工期间，项目部成立专门的风险识别和评价小组。风险评价小组成员应具备必需的 HSE 专业技术知识,掌握常用的风险评价方法,具备与风险评价相关的技巧和能力。

2.1.2 小组成员依据各种相关资料进行差距分析，对危害和影响列出清单，并进行评价

2.2 风险控制

2.2.1 针对识别出的危害制定出削减措施，施工前落实措施，消除风险后再进行施工作业，可按照《HSE 作业指导书》实施。

2.2.2 针对风险评价后存在风险性较大的作业项目，编制专项作业指导书并实施。

第五章、应急计划

HSE 应急管理体系的宗旨是体现预防为主，采取风险防范措施把事故消灭在萌芽状态从而实现无事故、无危害、无污染的终极目的。为确保施工作业人员健康与安全，确保国家财产不受损失，保护资源，避免环境污染，做到在各种紧急情况下能够迅速、高效、有序地进行应急处理工作，把事故危害降低到最低程度。在做好施工现场调查、风险评价的同时，强化项目应急管理，最大限度的保证有充分的人力、物力来应付各种险情或事故的发生，保证 HSE 管理体系可持续发展。

5.1 成立项目部应急组织机构，明确相关人员和部门职责。

5.2 编制项目部应急救援预案，组织应急演练培训，实施应急预案。

广西公司2025年巡线便道修建项目(标段二)(华南公司)/广西公司2025年巡线便道修建项目(标段二)(西南管道) 应急演练计划									
序号	组织单位	演练题目	演练时间	演练地点	演练内容涵盖哪些项目	参加人员范围	演练形式	演练类型	备注
1	河北燕青建工集团有限公司	广西公司2025年巡线便道修建项目(标段二)(华南公司)/广西公司2025年巡线便道修建项目(标段二)(西南管道)	2025年 月 日	施工现场	人员坠落应急演练	施工单位管理人员、现场作业人员	实战演练	安全风险演练	
2	河北燕青建工集团有限公司	广西公司2025年巡线便道修建项目(标段二)(华南公司)/广西公司2025年巡线便道修建项目(标段二)(西南管道)	2025年 月 日	施工现场	物体打击应急演练	施工单位管理人员、现场作业人员	实战演练	安全风险演练	
3	河北燕青建工集团有限公司	广西公司2025年巡线便道修建项目(标段二)(华南公司)/广西公司2025年巡线便道修建项目(标段二)(西南管道)	2025年 月 日	施工现场	火灾应急演练	施工单位管理人员、现场作业人员	实战演练	安全风险演练	

填表日期：2025年 月 日


项目负责人：

应急演练记录

学习项目名称	广西公司 2025 年巡线便道修建项目(标段二)(华南公司)/广西公司 2025 年巡线便道修建项目(标段二)(西南管道)				授课人			
学习日期	2025 年 月 日	有无考核 (打钩)		有无评估 (打钩)				
学习学时		参加人数		主办部门				
培训人及岗位								
课 时	小时							
学时统计(学习学时*参加人数):								
序号	姓名(签名)	成绩	序号	姓名(签名)	成绩	序号	姓名(签名)	成绩
1			11			21		
2			12			22		
3			13			23		
4			14			24		
5			15			25		
6			16			26		
7			17			27		
8			18			28		
9			19			29		
10			20			30		
序号	学习主要内容							
1	人员坠落应急演练							
2	物体打击应急演练							
3	火灾应急演练							
学习总结:通过本次应急演练,我单位人员增强了组织对突发事件的应对能力,通过模拟各种可能的紧急情况,组织成员可以了解应对策略、流程和标准操作程序,这有助于提我单位人员在突发时刻的反应速度、决策能力和团队协作能力。 2025 年 月 日								
施工单位现场负责人签字: _____ 年 月 日								

第六章、附图

1、应急响应程序

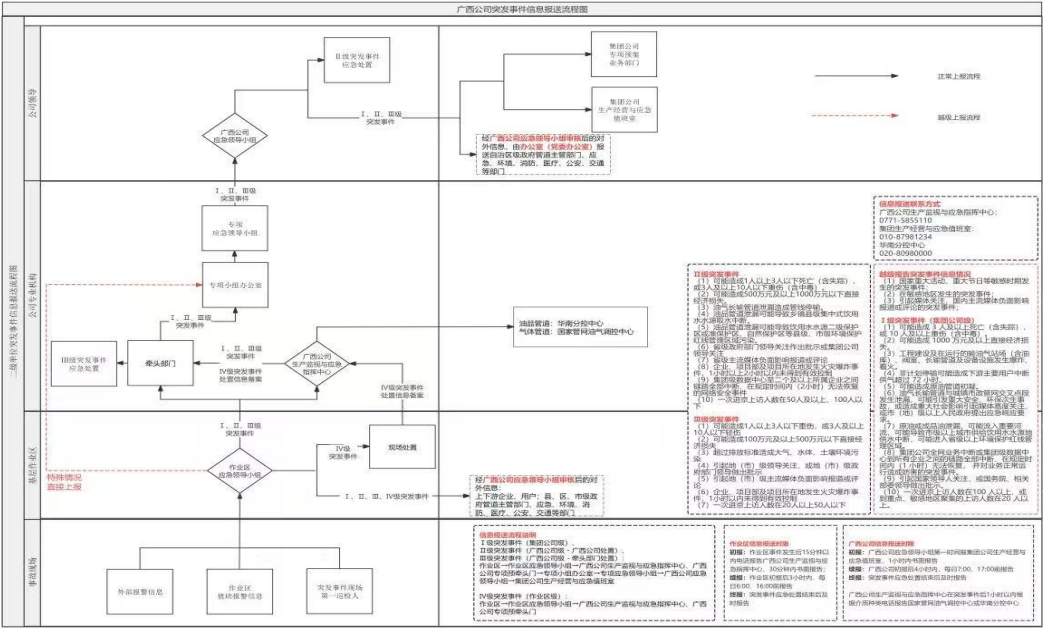

如发生突发事件，按照广西公司的汇报流程配合做好各项应急工作。

2、应急流程图

