

B.4.4 管理文件报审表

B.4.4	管理文件报审表	单位工程名称：广西公司2025年巡线便道修建项目(标段二)（华南公司） 单位工程编号：/								
致：国家石油天然气管网集团有限公司华南分公司（监理/建设单位） 根据合同约定，我方广西公司2025年巡线便道修建项目(标段二)（华南公司）已完成了管理体系文件的编制工作，经自审合格，请予以审查。 附： <table><tr><td>1、《HSE作业指导书》</td><td>1份</td></tr><tr><td>2、《HSE作业计划书》</td><td>1份</td></tr><tr><td>3、《HSE检查表》</td><td>1份</td></tr><tr><td>4、应急预案</td><td>1份</td></tr></table> 施工单位（盖章）：项目经理（签字）：日期：2025年10月20日			1、《HSE作业指导书》	1份	2、《HSE作业计划书》	1份	3、《HSE检查表》	1份	4、应急预案	1份
1、《HSE作业指导书》	1份									
2、《HSE作业计划书》	1份									
3、《HSE检查表》	1份									
4、应急预案	1份									
文件主要内容	进一步加强广西公司2025年巡线便道修建项目(标段二)（华南公司）施工安全管理工作，指导各参建队伍各岗位操作，规范岗位HSE行为，降低或消除岗位风险，保证HSE管理体系的有效实施运行；分析项目实施过程中的风险、消减措施；现场HSE检查；面对可能发生的安全事故，及时采取抢救措施，高效、有序地组织开展触电、火灾以及机械等伤害事故的抢救工作，最大限度地减少人员伤亡和财产损失；									
审查意见： 总承包单位（盖章）：技术负责人（签字）：日期： 年 月 日										
审查意见： 监理/建设单位（盖章）：监理/业务工程师（签字）：日期：2025年10月20日										



广西公司 2025 年巡线便道修建项目 (标段二) (华南公司)/(西南管道)

HSE 作业计划书

	签字	职务	日期
编制人:	彭清	现场负责人	2025 年 10 月 18 日
审核人:	卢海亮	项目经理	2025 年 10 月 18 日
批准人:	司艳会	技术负责人	2025 年 10 月 18 日

河北燕青建工集团有限公司 (盖章)

2025 年 10 月 18 日



目 录

第一章、工程概况	1
第二章、组织机构和职责	4
第四章、应急组织机构	8
第五章、应急措施	9
第六章、管理制度和作业指南	17
第七章、信息交流	18
第九章、监督和整改	21
第十章、审核与总结回顾	22

第一章、工程概况

一、工程概况

2.1 工程名称：广西公司2025年巡线便道修建项目(标段二)(华南公司)、广西公司2025年巡线便道修建项目(标段二)(西南管道)

2.2 工程地点：广西百色、邕宁、河池、黎塘、玉林区域

2.3 工程内容：广西公司管辖管道线路经过山区地段较多且地势陡峭，目前巡线通道多为简易步梯，当遇下雨天，便道湿滑，容易造成人身伤害。此外，部分管段跨越河沟，缺少便桥，涉水存在安全隐患。为了便于巡线人员更好的开展线路巡查,减少打孔盗油风险,提升应急响应速度,进一步保障管道运行安全计划修建巡线便道和便桥，

2.4 工程特点：野外山区作业，施工条件复杂、限制多，环境影响大，基础设施薄弱，高风险作业集中，安全管控难度大，施工工序关联性强，协同要求高。

二、作业基本信息

序号	项目	内容
1	工程名称	1) 广西公司 2025 年巡线便道修建项目(标段二)(华南公司) 2) 广西公司 2025 年巡线便道修建项目(标段二)(西南管道)
2	甲方(发包人)	1) 国家石油天然气管网集团有限公司华南分公司 2) 国家管网集团西南管道有限责任公司南宁输油气分公司
3	所属单位及涉及数量	巡检便道共计：33 处、巡检便桥共计：28 处
		1) 百色作业区共：24 处（巡检便道 5 处、巡检便桥 19 处）
		2) 邕宁作业区共：16 处（巡检便道 8 处、巡检便桥 8 处）
		3) 河池作业区共：12 处（巡检便道 11 处、巡检便桥 1 处）
		4) 黎塘作业区共：7 处（巡检便道 7 处）
		5) 玉林作业区共：2 处（巡检便道 2 处）
4	计划工期	2025 年 10 月 1 日起至 2026 年 04 月 30 日止
5	工程地点	广西百色、邕宁、河池、黎塘、玉林区域

6	工程质量	合格，达到设计要求，无质量、安全事件发生，符合国家和行业现行有关施工及验收规范。
---	------	--

三、百色、邕宁、河池、黎塘、玉林作业区主要内容及工作量

表4.1 广西分公司2025年巡线便道修建项目百色作业区主要工程量一览表					
序号	工程名称	项目	单位	工程量	备注
1	巡线便道	便道 C20 混凝土	m³	526	踏步暂按 80%计量
		模板面积	m²	469.5	按周转一次考虑
		土方开挖	m³	250.4	
		清表整平	m²	3130	
		平均倒运距离	m	900	
		发电机	台班	85.7	按 10kw 柴油发电机考虑
		管道桩	根	31	按间距 100m 考虑
2	巡线便桥	人工清表	m³	32.4	
		人工开挖	m³	663.4	
		C20 混凝土	m³	2.88	
		C30 板混凝土（P6）	m³	21	
		C30 墩混凝土（P6）	m³	15.19	
		C30 基础混凝土（P6）	m³	3.12	
		浆砌石	m³	6.21	
		不小于 12 钢筋	kg	3052	
		其它钢筋	kg	701	
		钢材	kg	1666	
		木模板（桥板）	m²	123.4	
		木模板（基础）	m²	58.3	
		抽水泵（台班）	个	4	
		发电机（台班）	个	4	
		黏土围堰	m³	52	
		二次搬运	m	180	
3	占地 补偿		亩	3.8	
4	青苗 赔偿		项	1	
注：实际工程量以签字验收收方工程量为准。					

表4.1 广西分公司2025年巡线便道修建项目邕宁作业区主要工程量一览表

序号	工程名称	项目	单位	工程量	备注
1	巡线便道	便道 C20 混凝土	m³	302.5	踏步暂按 80%计量
		模板面积	m²	270	按周转一次考虑
		土方开挖	m³	144	
		清表整平	m²	1800	
		平均倒运距离	m	300	
		发电机	台班	50	按 10kw 柴油发电机考虑
		管道桩	根	18	按间距 100m 考虑
2	巡线便桥	人工清表	m³	15	
		人工开挖	m³	168.9	
		C20 混凝土	m³	4.32	
		C30 板混凝土（P6）	m³	12.58	
		C30 墩混凝土（P6）	m³	25.37	
		C30 基础混凝土（P6）	m³	9.36	
		不小于 12 钢筋	kg	2734.8	
		其他钢筋	kg	781.2	
		钢材	kg	1675.8	
		木模板（桥板）	m²	75.5	
		木模板（基础）	m²	69.76	
		抽水泵（台班）	个	6	
		发电机（台班）	个	6	
		黏土围堰	m³	97	
		二次搬运	m	250	
3	占地补偿		亩	2.2	
4	青苗赔偿		项	1	
注：实际工程量以签字验收收方工程量为准。					

表4.1 广西分公司2025年巡线便道修建项目河池作业区主要工程量一览表

序号	工程名称	项目	单位	工程量	备注
1	巡线便道	便道 C20 混凝土	m³	366.3	踏步暂按 80%计量
		模板面积	m²	327	按周转一次考虑
		土方开挖	m³	174.4	
		清表整平	m²	2180	
		平均倒运距离	m	200	
		发电机	台班	60	按 10kw 柴油发电机考虑
		管道桩	根	21	按间距 100m 考虑
2	巡线便桥	人工清表	m³	6	
		人工开挖	m³	67	
		C20 混凝土	m³	2	
		C30 混凝土（P6）桥板	m³	3.75	
		浆砌石	m³	24	
		不小于 12 钢筋	kg	576	
		木模板（桥板）	m²	12.2	
		发电机（台班）	个	2	
		二次搬运	m	150	
3	占地补偿		亩	2.7	
4	青苗赔偿		项	1	
注：实际工程量以签字验收收方工程量为准。					

表4.1 广西分公司2025年巡线便道修建项目黎塘作业区主要工程量一览表

序号	工程名称	项目	单位	工程量	备注
1	巡线便道	便道 C20 混凝土	m³	740	踏步暂按 80%计量
		截水沟 C25 混凝土	m³	16.5	黎塘作业区修建截水沟
		模板面积	m²	660	按周转一次考虑
		土方开挖	m³	352	
		清表整平	m²	6200	
		平均倒运距离	m	310	
		发电机	台班	120	按 10kw 柴油发电机考虑
		管道桩	根	44	按间距 100m 考虑
2	占地补偿		亩	5.3	
3	青苗赔偿		项	1	
注：实际工程量以签字验收收方工程量为准。					

表4.1 广西分公司2025年巡线便道修建项目玉林作业区主要工程量一览表

序号	工程名称	项目	单位	工程量	备注
1	巡线便道	便道 C20 混凝土	m³	840	踏步暂按 80%计量
		模板面积	m²	750	按周转一次考虑
		土方开挖	m³	410	
		清表整平	m²	5000	
		平均倒运距离	m	410	
		发电机	台班	137	按 10kw 柴油发电机考虑
		管道桩	根	50	按间距 100m 考虑
2	占地补偿		亩	6.0	
3	青苗赔偿		项	1	
注：实际工程量以签字验收收方工程量为准。					

第二章、组织机构和职责

一、施工组织机构

序号	职务	姓名	职责	联系电话	备注
1	项目经理	卢海亮	1)对本项目的安全管理工作总体负责发生异常事故时负责全局指挥。 2)现场施工作业直接管理责任人。	1341245263	
2	技术负责人	司艳会	1) 技术资料的收集和整理; 2) 全面负责本工程技术、组织施工技术方案编制; 3) 对实施人员进行技术交底; 4) 组织竣工报告的编制等工作; 5) 负责施工过程中技术指导及解决疑难问题。	13832432566	
3	质量员	赵艳辉	1) 负责各工序质量的抽查。协助项目经理和项目总工程师做好详细的质量技术方案的编制工作; 熟悉施工程序, 技术规范, 质量标准和操作规程; 2) 对施工现场能进行有效质量控制, 做好施工前质量技术交底工作, 能处理施工现场中出现的一般质量问题; 严格按照有关规定做好质量资料的整理和上报工作。	1868903475	
4	安全员	笪丽伟	1) 负责本工程安全管理, 对施工过程中安全检查, 监控; 2) 对项目安全、健康、环保、安保工作进行技术交底; 3) 向项目经理和公司安全部门汇报安全管理工作; 4) 对违规作业进行处罚并督促整改。	15653478484	

二、施工作业采用的主要设备表

序号	名称	型号规格	数量	备注
一	机械设备			
1	汽油机水泵	JHWP50S	1	
2	切割机	Z1E-FF06-110	1	
3	锂电振动棒	25#	1	
4	工程车	本田/长安	1	
二	施工工具			
1	铁锹、铁铲、铁抹子	/	若干	
2	手推灰车	/	2 台	
三	安全物资			
1	警示带	100m/盘	5 盘	
2	灭火器	干粉 8GK	2 台	
3	安全带	/	2 套	
四	标准化施工现场			
1	安全标志牌	200*160mm	2 套	
2	可移动防雨蓬	2*2*4m	2 套	
五	应急物资			
1	应急车		1 辆	
2	医用药箱	/	1 套	配备相关药品
3	防虫驱蚊等药品	/	2 瓶	
4	灭火器	干粉 8GK	2 个	
5	铁铲		2 把	

6	铁锹		1 把	
7	安全警示带		1 卷	
8	雨衣		2 件	
9	雨鞋		2 双	
七	环保物资			
1	现场废旧垃圾回收箱	/	1 只	
2	密目式防尘网	/	300 m²	

第三章、风险削减及安全技术措施

过程和活动	风险因素	危害和影响	消减措施
进场准备 人员管理	1. 因无证上岗、违反操作规程、违章指挥、违章作业、违反劳动纪律及管理原因。	1. 人身伤害 2. 污染环境 3. 损坏设备 4. 影响生产	1. 人员证件上岗制度、培训考试制度； 2. 巡查制度。
设备管理	1. 由于设备和设施不安全、劳动条件和作业环境不良或危险、工艺方法或流程瑕疵、管理不善所发生的。	1. 人身伤害 2. 污染环境 3. 损坏设备 4. 影响生产	1. 设备保养、设备检查、设备合格证、设备检验制度； 2. 人员设备培训。
施工过程 机械伤害、 物体砸伤、 碰伤	1. 未佩戴安全帽，劳保用品； 2. 违章操作设备、违章使用工具。	1. 人员伤亡 2. 设备损坏	1. 进入作业现场必须佩戴安全帽； 2. 禁止从高处投扔工具； 3. 严格按照操作说明使用设备和工具。

过程和活动	风险因素	危害和影响	消减措施
人员跌落、 高处坠落	1. 施工现场无明显标志，防护设施缺失或不规范 2. 员工安全意识不强 3. 管理与监测缺失 4. 未按要求施工	1. 人员伤亡事故 2. 工程延误 3. 责任追究与信誉损失	1. 严格执行方案要求施工； 2. 全程施工作业做好防护措施，安全培训交底，监护到位。
火灾	1. 吸烟及携带火种 2. 劳保服装及工鞋不合格	1. 人员伤害 2. 设备损坏	1. 禁止吸烟，携带火种。 2. 配备符合要求的劳动保护用品， 3. 配备符合要求的防爆工具。

第四章、应急预案

一、应急组织机构

1、现场应急指挥

基本职责。根据突发事件的进展、相关工作预案和领导指示，组织指挥参与现场救援的各单位，迅速控制局势，力争把损失降到最低限度；组织公安、交通等部门和属地政府做好现场管控、交通保障、人员疏散和安置工作；协调各相关部门和单位，做好调查、善后工作，防止出现次生、衍生灾害，尽快恢复正常秩序；及时向上级应急指挥机构报告重要信息，及时向有关单位通报情况。

核心要素。包括设立指挥场所、提供办公设备和现场标识管理。根据突发事件的性质、种类、危害程度或实际需要，按照“安全就近、方便指挥”的原则，在灾害事故现场周边适当的位置或指挥通信车辆上设立指挥场所，包含办公、集结、新闻采访和新闻发布等区域。场所内应有办公果椅、电话传真、电脑、打印机等基本办公设备，应具备召开会商会议的能力。按照“方便辨识、位置醒目”的原则，及时发放各种标识，禁止无关人员和车辆进出现场，确保现场秩序。

2、项目部HSE监督：

坚持按期开展各种形式的安全。环境与健康检查，检查应有重点，针对性强，以提高检查效果。按制定的检查标准和检查范围逐项检查，防止随意性。在项目部HSE检查过程中，不断改善提高HSE水平、

3、应急小组：

负责事故现场的应急指挥工作，进行应急任务分配和人员调度，有效利用各种资源，保证在最短时间内完成事故的应急行动。

4、项目部应急指挥及救援组织机构

项目部安全领导小组	事故现场抢险组
	事故现场救护组
	后勤工作组

5、项目部安全小组机构组成

项目部安全领导小组		
组长	卢海亮	总指挥副组长负责指挥处理紧急情况的全面工作
事故抢救小组		
组员	司艳会	负责日常执行抢救工作
事故救护组		
组员	笪丽伟	负责执行救护工作
后勤工作组		
组员	赵艳辉	负责发放救援物资


6、应急机构联络电话

单位	姓名（部门）	职务	地址	联系电话
----	--------	----	----	------

上级应急救援组织				
广西分公司	唐水源	项目负责人	南宁良庆区富德广场	18169681420
百色作业区	蒙俊锋	管道副主任	广西百色	13517765617
邕宁作业区	袁业盛	管道副主任	广西邕宁	177776008461
河池作业区	孙常龙	管道副主任	广西河池	17776671177
黎塘作业区	马玉宝	管道副主任	广西黎塘	18977194765
玉林作业区	张越龙	管道副主任	广西玉林	18107719621
外部依托				
各地人民医院	医疗急救	政府部门	以现场实地地为准	120
各地消防支队	火灾报警	政府部门	以现场实地地为准	119
各地派出所	紧急求援	政府部门	以现场实地地为准	110
其它				
河北燕青建工集团有限公司	卢海亮	项目经理	广西南宁	1341245263
河北燕青建工集团有限公司	司艳会	技术负责人	广西南宁	13832432566
河北燕青建工集团有限公司	笪丽伟	安全员	广西南宁	15653478484

二、应急响应程序

1、应急响应程序

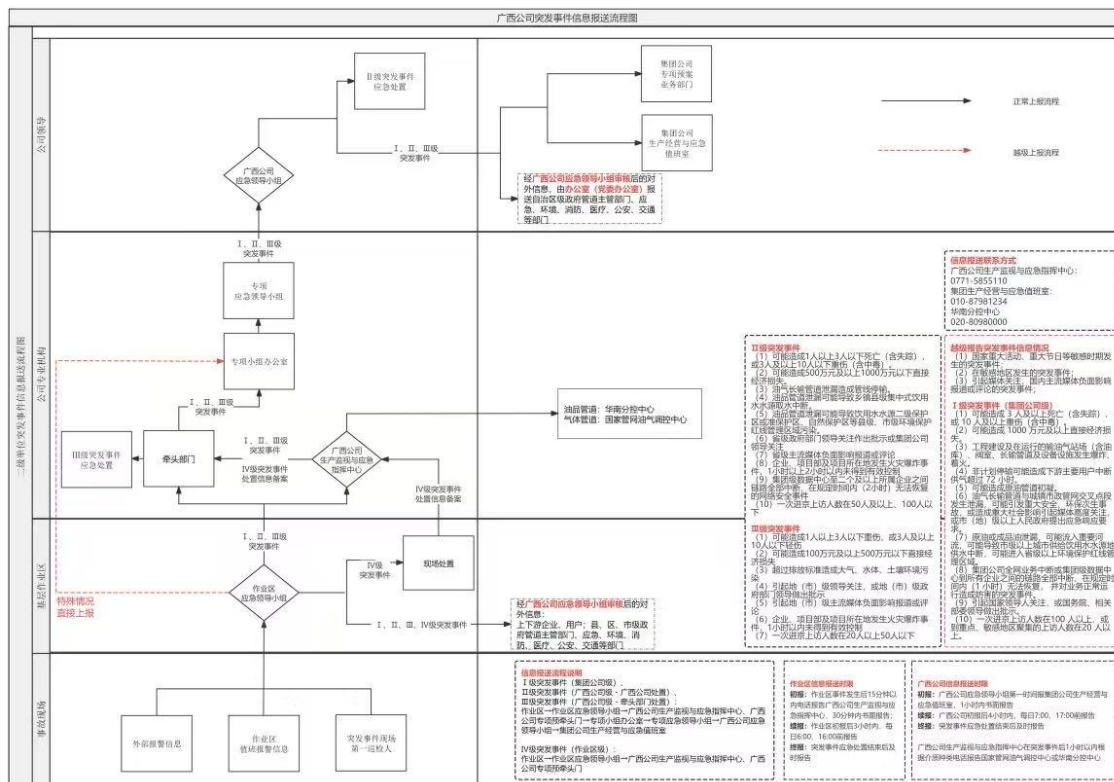

如发生突发事件，按照广西公司的汇报流程配合做好各项应急工作。

2、应急联络

参与项目施工作业的任何人员发现紧急情况必须首先报告施工现场应急领导小组或应急指挥，应急指挥判断事态，应当视灾害的规模、状态、人员伤亡情况，立即采取自救或同施工当地急救中心、医院、消防队等相关部门联系，请求支援。

三、施工中可能出现的风险及防控措施

(1) 便道选址勘察风险

1) 高处坠落、滑倒摔伤或地质灾害导致人员受伤，防控措施：a 勘察人员配备防滑鞋、安全帽、安全带；提前研判地质和天气，雨天或地质风险高时暂停勘察；b. 设置专人监护，携带应急通讯设备；c. 作业区域必须设立警示隔离区域并专人负责检查、悬挂安全警示标志、标识；d. 严禁无关人员进入作业区域。

2) 工器具质量不合格导致人员伤害、设备损坏，防控措施：a 正确穿戴劳保着装，保持施工现场秩序，工器具有序摆放；b 对进场工器具、设备设施进行外观、产品合格证书检查。

(2) 施工材料运输风险及防控措施

1) 车辆侧翻、材料掉落、交通事故导致人员伤亡、材料损坏；防控措施：a 选用具备山区运输资质的车辆和驾驶员；b 材料采用专用固定装置捆扎牢固，超限材料办理运输许可；c 运输时控制车速，设置警示标识，保持车距。

(3) 便道基础开挖风险及防控措施

1) 工器具使用不当造成机械伤害导致人员伤亡、设备损坏；防控措施：a 正确穿戴劳保着装，保持施工现场秩序，工器具有序摆放。b 按照操作规程使用工器具；c 开挖过程中避开人个人一起近距离施工，防止工具伤人。

(4) 便道主体施工（硬化、浇筑等）风险及防控措施

(1) 高处坠落、粉尘污染导致人员伤亡；防控措施：a 高处作业人员系安全带，设置安全网；b 现场配备除尘设备，作业人员佩戴防尘口罩。

(5) 便桥搭建风险及防控措施

1) 溺水、起重伤害导致人员伤亡；防控措施：a 作业人员穿戴救生衣；b 起重设备经检验合格，操作人员持证上岗，严格执行起重操作规程；c 便桥搭建前进行结构验算，施工中全程监测结构稳定性。

(6) 施工收尾与现场清理风险及防控措施

1) 物体打击、环境污染导致人员伤亡、环境污染；防控措施：a 及时清理现场材料和垃圾，分类存放并规范处置；b 施工废水经沉淀处理后排放，建筑垃圾运至指定消纳点。

4、野外施工常见风险急救措施

(1) 着火应急措施

- 1) 作业人员发现起火，应立即呼救，通知现场负责人。
- 2) 现场全体人员听到呼救后，要立即停止一切工作视火灾大小与燃烧的程度前往救援。
- 3) 灭火时不能慌乱，要统一服从施工现场领导指挥。
- 4) 要准确判断起火部位，迅速切断该区域的油、气、电。
- 5) 若起火致柏积小，要迅速有组织的用灭火器、水、水湿的毛毡、衣服扑灭。
- 6) 若大面积起火或预测到火灾会迅速发展，不易扑灭，应立即拨打119 向消防部门报警。
- 7) 采取措施有组织的隔离或消除附近的易燃易爆、有至物品和机械设备，把它们转移到上风或远离。

8)若有浓烟和有窒息气体，要用湿毛巾或防毒面具捂住口鼻，保护呼吸。

9)抢救顺序是先人后物，先贵后廉。同时要防止二次伤害。

(2) 工具伤害应急措施：

1)发现有人被工具割伤或打击中时，应立刻停止工具作业，电动工具则马上切断电源。

2)紧按伤口，撤离出作业坑，呼救救护人员进行应急救治。如电源控制器较远，应就近使用木、竹等绝缘具器给触电者切断电源。雨天气要采取措施防止再次触电。

3)现场救护人员应立刻取得应急药品到达伤员处进行伤口包扎、消毒、止血，防止伤口感染。

4)急救处理后立即安排车辆将伤者送到附近的医院施教。

(3) 蛇虫叮咬应急措施：

1)撤离：让伤者缓慢、平静地远离蛇虫，避免再次被咬。

2)让伤者保持安静。避免任何不必要的活动，以减缓毒素随血液扩散的速度，最好采取坐位或卧位。

3)清洁伤口(如果条件允许且安全)：用清水和肥皂(如有)轻轻冲洗伤口。不要用力擦洗。

4)注意观察被叮咬的毒蛇和毒虫种类，告知医生进行对症下药。

5)立即拨打急救电话(如120)或安排交通工具尽快送医。告知是毒蛇或毒虫咬伤。

6)禁止切割伤口，禁止用嘴吸吮。

5、防汛应急措施：

做好汛期的施工安排，对保证本工程以后的施工进度和质量有着重大的影响，为保证工期，汛期施工以预防为主，采用防御措施及加强排水手段，适时地调整工序施工确保汛期正常的施工生产。

现场成立以项目经理为首的汛期施工领导小组，负责组织实施汛期施工的各项质量保证措施，首先全面地调查施工现场的地势，调查天然排水系统及原有的排水管道等泄水能力，并走访沿线村庄居民、工厂及机关，以便研究制定汛期排水方案，然后根据以上调查情况认真编制汛期施工方案，报监理工程师审批后组织施工人员学习，确保每个工序按标准、规范规程和技术措施组织施工。

设专人值班接收天气预报，及时了解天气情况，做好防范工作。

与当地政府有关部门密切联系，疏通现有排水系统，保证排水通畅。

如发生意外应做出如下处置：

(1) 立即组织营救受害人员，组织撤离或者采取其他措施保护危害区域内的其他人员。抢救受害人员是应急救援的首要任务，在应急救援行动中，快速、有序、有效地实施现场急救与安全转送伤员是降低伤亡率、减少事故损失的关键。由于重大事故发生突然、扩散迅速、涉及范围广、危害大，应及时教育和组织公认采取各种措施进行自身防护，必要时迅速撤离危险区或可能受到危害的区域。在撤离过程中，应积极组织职工开展自救和互救工作。迅速控制事态，并对洪灾事故造成的危害进行检测、监测、测定事故的危害区域、危害性质及危害程度。及时控制住造成洪灾事故的危害源是应急救援工作的重要任务，只有及时地控制住危险源，防止事故的继续扩展，才能及时有效进行救援。发生洪灾事故，应尽快组织义务防汛队与救援人员一起及时控制事故的继续扩展，才能及时有效进行救援。发生洪灾事故，应尽快组织义务防汛队与救援人员一起及时控制事故继续扩展。

(2) 消除危害后果，做好现场恢复。针对事故和人体、土壤、空气等造成的现实危害和可能的危害，迅速采取封闭、隔离、洗消、检测等措施，防止对人的继续危害和对环境的污染。及时清理废墟和恢复基本设施。将事故现场恢复至相对稳定的基本状态。

(3) 查清事故原因，评估危害程度。事故发生后应及时调查事故发生的原因和事故性质，评估出事故的危害范围和危险程度，查明人员伤亡情况，做好事故调查。


(4) 定期组织预案的演练，提高处置突发事件的水平。及时开展应急知识的宣传教育，增强防范意识和应对能力；通过宣传讲座、教育片宣传等方式，队员工宣传工地防汛、抢险法律法规和有关规定，提高防汛意识。有计划地组织防汛抢险队进行《预案》实际演练，提高实际操作技能。

6、应急联络通信录

职务	岗位	职责
组长	项目经理	总指挥，负责启动应急预案，协调外部救援
副组长	技术负责人	现场指挥，组织救援人员，控制事故扩大
成员	现场负责人	负责现场作业人员撤离、受伤人员初步救治


成员	安全员	负责应急物资调配、事故记录与上报
成员	医护兼职人员	负责伤员止血、包扎、心肺复苏等初步处理

7、应急流程图

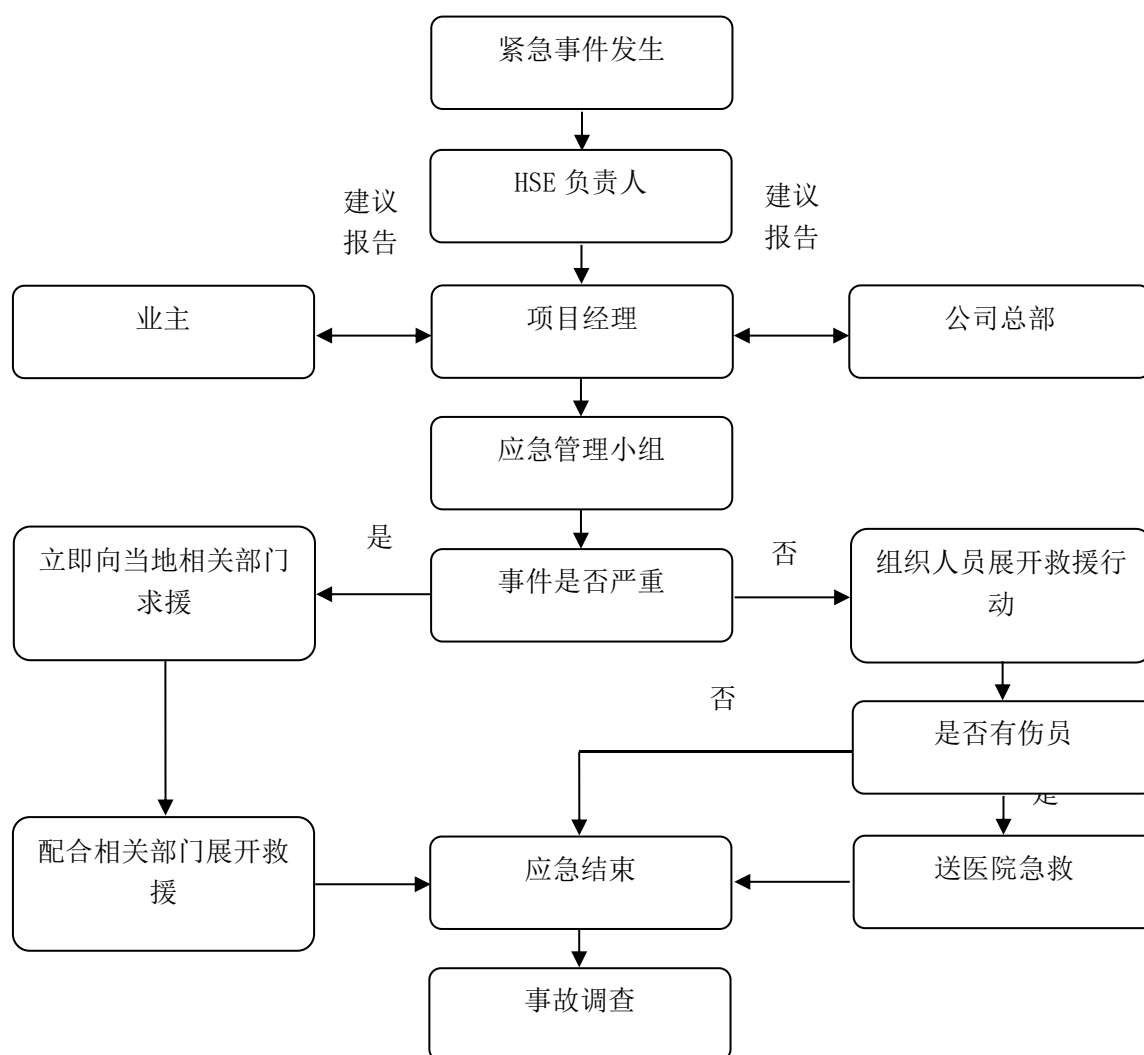

8、有关部门及联系方式

发生紧急情况 → 通知现场 → 应急指挥

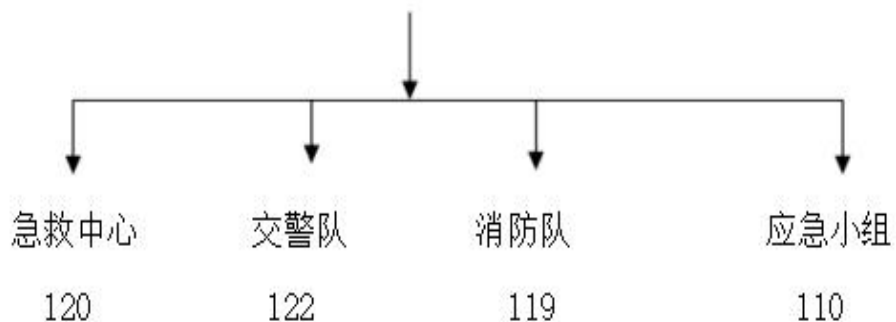

9、紧急医疗器具、药品的配备

序号	名称	规格	生产日期	有效日期	备注
1	复方对乙氨基酚片	10 片*1 板	2023. 07. 15	2028. 07. 14	
2	碘酊消毒液	20ml	2024. 12. 06	2026. 12. 05	
3	云南白药气雾剂	50 克	2024. 11. 05	2027. 10. 01	
4	医用棉签	50 支	2024. 02. 01	2027. 02. 01	
5	医用纱布	2 卷/袋	2024. 06. 05	2027. 06. 05	
6	过氧化氢消毒液	100mL	2023. 11. 28	2025. 11. 28	
7	创口贴	20 片	2025. 03. 01	2028. 03. 01	
8	藿香正气水	10 支	2025. 05. 29	2027. 05. 28	
9	季德胜蛇药片	15 片/2 盒	2024. 05. 20	2027. 04. 01	
10	速心救心丸	180 丸	2024. 10. 19	2027. 09. 01	

序号	名称	规格	生产日期	有效日期	备注
11	肠胃宁片	45 片	2023. 06. 09	2026. 05. 01	
12	跌打万花油	25ml	2024. 11. 07	2027. 04. 01	
14	复方倍氯米松樟脑乳膏	10 克	2025. 02. 15	2028. 01. 01	
15	温度计	1 支	/	/	

第六章、管理制度和作业指南

1、管理制度

详见 { HSE作业指导书}

2、文件控制

2.1、保持对相关文件的控制对实施HSE管理非常重要，这样一来可以使文件得以交流贯彻，发挥文件应有的作用，二来可以随时掌握该文件的流向，这样既可以保证文件在应用时随手可得，便于掌管，更可以随时更新文件版本，保持文件的适用性和有效性。

2.2、文件控制的原则

- (1) 以部门、职能机构标：记
- (2) 在发布时由授权人批：准
- (3) 清楚划分哪些是必须遵守，的哪些是指导性的：
- (4) 定期和系统地进行审查，如有必要或需要时特殊要求做出反应，时应对控制程序进行修改。
- (5) 在所有需要的地方可以得到现行有效：版本
- (6) 规定和明确变更和修改程：序
- (7) 作废时立刻从发行和使用处拿走。

第七章、信息交流

在HSE管理过程中，信息交流起着非常重要的作用，无论是与相关方的信息交流，施工队与项目部间的联系，还是进行变更管理的信息交流，对于有效实施HSE管理都十分必要。

1、HSE 会议

项目部的HSE管理领导小组会议及项目HSE管理例会由项目经理主持召开，项目安全经理负责会议的会务和记录；施工工作班组的HSE管理例会由班组长负责组织，班组HSE兼职监督员负责会议的记录工作。

1.1、会议的类别与内容

会议的分类：HSE管理委员会或HSE管理领导小组会；HSE例会；HSE专题会议班前会。

1.2、会议内容

1.HSE管理委员会或HSE管理领导小组会议内容

- a、制定、修改公司或项目部的HSE管理方针和HSE目标；
- b、审查项目部HSE目标的实现情况和HSE管理状况；
- c、审定HSE不符合项的整改措施，检查HSE不符合项的整改情况；
- d、总结前一阶段的HSE工作情况，研究确定下一步的HSE工作计划。

2.HSE例会的主要内容

- a、传达本公司有关HSE管理的文件、指示、通报等
- b、发布有关的HSE工作信息，交流各类HSE管理经验；
- c、分析、通报HSE管理状况；
- d、总结讲评前期的HSE管理工作；
- e、布置、安排下一步的HSE工作计划；
- f、检查HSE不符合项的整改情况，提出不符合项的进一步整改意见。

3.HSE 专题会议的主要内容

- a、HSE事项的专题情况及存在问题介绍
- b、专项HSE措施的研究；

c、专项HSE管理活动的安排和资源配置。

4. 班前会的主要内容

a、工作任务布置；

b、施工作业的HSE要求和注意事项；

c、施工作业过程的应急措施和要求。

1.3会议的组织和管理工作

1. HSE管理委员会：

项目部的HSE管理领导小组会议由项目经理主持，召开项目部质安组负责会议的会务及记录工作。

2. HSE例会

a、HSE例会分为项目部HSE例会与班组HSE例会。

b、项目部的HSE例会每月召开一次；施工班组的HSE例会（周一安全活动）每周召开一次。

c、HSE例会的组织：项目部HSE例会由项目经理主持召开，HSE经理、项目部领导和项目部各业务部室负责人、施工队负责HSE监督、员及施工班组长参加，项目部质安组负责会议的会务和记录；施工工作班组HSE例会（周一安全活动）由班组长负责召开，开班组全体成员和有关领导及HSE监督员参加HSE兼职监督员负责会议的记录工作。施工班组HSE例会可与班前会结合进行。

3. HSE专题会议

a、项目部HSE专题会议是为了研究解决某HSE管理事项而临时召开的HSE会议，会议可以以座谈会、现场会、研讨会、总结表彰会和工作会议等形式召开。

b、HSE专题会议由各单位HSE管理负责人或所议专题负责人，提出项目总工程师负责会议准备并确定HSE专题会议的召开时间。

c、HSE专题会议项目部HSE管理负责人或所议专题负责人负责，召开项目部质安组组长负责会议的会务和记录工作。

4. 班前会

a、施工班组应在每天上岗作业前按照QG/SJ25.03.06-2002《施工班组班前会管理规定》的有关规定组织召开班前会，布置、安排本班组当天工作任务，提出施工作业的

HSE要求和注意事项；

B、班前会由班组兼职HSE监督员负责做好记录。

5. 会议记录

a、各类HSE会议均应确定会议记录人，使用专用会议记录本进行会议记录，必要时，应形成会议纪要。会议记录内容应包括：会议时间、地点、主持人和与会人员名单；会议议题及议程；会议发言内容及确定的事项。

b、会议记录应在整理后进行建帐登记和归档，会议记录应简明扼要，内容应完整无缺项；会议记录应至少保存两年。

c、会议记录或纪要需要下发，时由项目部综合组负责发放。

2、报告与记录

本项目施工过程中HSE管理记录的编制、采集、整编和，保由管项目部质安组工程技术人员共同负责组织实施和管理；HSE管理记录的分类与分类内容

1. HSE管理记录的分类

a、项目准备过程HSE管理记录；

b、项目工程施工过程HSE管理记录；

c、项目工程施工过程HSE因素监视和测量记录。

2. HSE管理记录的分类内容

a、HSE管理体系管理记录内：容HSE管理培训记录；内、外部HSE管理体系审核记录；HSE管理体系管理评审记录；

b、施工过程HSE管理记录内容： 施工准备过程范围内的HSE管理记录；施工过程范围内的HSE管理记录；

c、项目工程施工过程HSE因素监视和测量记录内： 容施工过程中本公司内部组织的HSE管理检查记录； 施工过程中国家、施工所在地政府及上级组织的HSE管理检查记录；施工过程中本公司内部组织的监视和测量记录；

d、施工过程中国家相关监测机构或上级组织HSE因素监视和测量记录。

3. HSE管理记录的管理

a、本项目施工范围内HSE管理记录文件，统一采用QG/SJ25.04-2002《HSE管理记录文件规定》规定的记录文件格式。

b、本工程施工过程的HSE管理记录文件，施工过程中由本项目部质安组负责保管，工程竣工交付后，交本公司安全监督处实施档案管理保管期为三年。

3、野外通讯

在野外基站少，信号弱，因此手机通信并不是完全行得通。但是在野外某块区域可能信号强度相对较好，这时就可以利用手机进行通信。达到及时通信的效果。

4、变更管理

根据本项目部的工程特点，确定以下方面实施变更管理：

- (1) 施工方案的变更；
- (2) 设计修改；
- (3) 包确定为危险性大的作业；
- (4) 其他重大事项。

以上事项的变更管理的实施步骤，按照本公司的规定执行。

5、与相关方的交流

与相关方的交流、协商、沟通采用会议、文件、通知、信息反馈、电话、谈话、电子媒体、公告等方式进行交流。

第九章、监督和整改

1、整改

对业主、监理安全检查发现的问题、隐患要立即整改，及时反馈整改情，况项目部HSE检查发现的隐患要立即整，改对暂时不能整改的隐患以隐“患整改通知单”的形式下发，责令相关单位限期整，改HSE监督员进行复检，登记上帐。

2、事故的调查

所有事故，包括具有较高潜在危险的事故苗头，都需要作适当的调查。

2.1 事故调查的程序

- (1) 组织事故调查组，事故调查的级别决事实上于事故的大小、事故严重程度及其实际和潜在的后果，根据事故种类、性质、级别等确定事故调查的组成人员；
- (2) 明确事故调查内，容事故调查的内容一般包括调查事故发生的环境、经过等；死伤

者自身情况，人证、物证等方面情况；撰写调查报告。

(3) 制定事故调查方法。事故调查方法一般包括现场勘察、物斑点搜集、人证材料搜集及其它部分材料搜集等。

2.2 通过事故调，查找出事故发生的真正原因，举一反三，制定和完善类似事故的防范措施，从而防止类似事故的再次发生，这是事故调查的最终目的。

2.3 如果事故发生时由于体系缺陷有关文件没有覆盖，就要跟据具体情况，提出相应的修改、完善意见，消除体系缺陷，完善文件覆盖范围，从而消除类似事故的发生。

第十章、审核与总结回顾

本工程项目部将根据本公司《审核、评审和持续改进》管理程序，在工程 施工中期进行一次内部审核、，评及审时找出本项目部HSE管理过程中存在的问题，并加以纠正；制定施工现场危险控制和削减措施，形成新的工作程序。
