

B. 4. 16 工程物资、材料进场报验表

B.4.16	工程物资、材料进场报验表				单位工程名称：广西公司2025年巡线便道修建项目(标段二)(华南公司) 单位工程编号：/
致：国家石油天然气管网集团有限公司华南分公司（监理/建设单位） 广西公司2025年巡线便道修建项目(标段二)(华南公司)（黎塘作业区）项目拟进场下列物资、材料，经我方检查符合设计、规范及合约要求，现予以上报，请批准使用。					
物资名称	规格型号	单位	数量	使用部位	备注
便道C20混凝土	C20	m ³	740	巡线便道	
截水沟C25混凝土	C25	m ³	16.5	巡线便道	
模板面积	/	m ²	660	巡线便道	
管道桩	/	根	44	巡线便道	
警示牌	/	个	65	围护	
安全帽	/	个	60	防护	
劳保服装	/	套	60	防护	
劳保手套	/	双	100	防护	
灭火器	干粉 8GK	个	2	防护	
急救箱	/	个	2	预防	

附件：

1. ☒ 出厂合格证	3 页
2. ☒ 厂家质量检验报告	6 页
3. ☐ 厂家质量保证书	1 页
4. ☐ 检验记录	1 页
5. ☐ 进场复检报告	1 页
6. ☐ 物资调拨单	1 页
7. ☐ 其他	1 页

施工单位（盖章）

技术负责人（签字）： 司艳会

日期： 2025 年 10 月 20 日

审验意见：

结论： ☒ 同意 ☐ 补报资料 ☐ 重新检验

监理/建设单位（盖章）

监理/项目负责人（签字） 9210179

日期： 2025 年 10 月 20 日


1、安全帽



2、灭火器



3、医药箱+灭火器箱

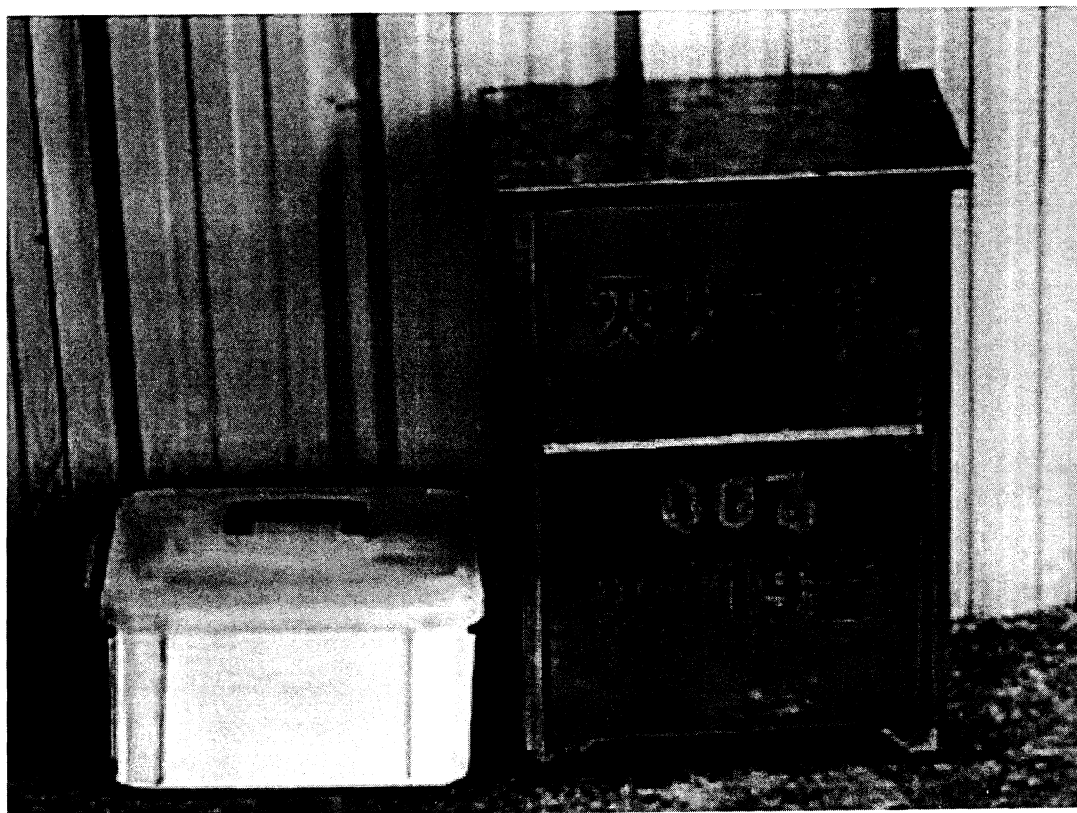

3、混凝土合格证

水泥检验报告

报告编号: C20250706

样品编号	C1107			取样日期	2025年07月7日			江华海螺水泥有限公司 梧州市建联建材有限公司 试验室 试(盖章)								
生产厂家	江华海螺水泥有限责任公司			检验起始日期	2025年07月8日											
品种、强度等级	P.O 42.5			报告日期	2025年08月6日											
出厂编号	IGP4Q210312			代表批量 (t)	500											
出厂日期	2025年05月6日			商标	海螺											
检验依据	《通用硅酸盐水泥》GB175-2007															
检验项目	标准稠度用水量(%)	凝结时间		安定性 (雷氏法)	强 度 (MPa)											
		初 凝 (min)	终 凝 (min)		抗 折				抗 压							
					3d		28d		3d		28d					
技术要求	—	≥45	≤600	合 格	≥		≥		≥		≥					
检验结果	26.0	125	185	合 格	X= 6.0		X= 8.1		X= 28.6		X= 52.4					
					5.9	5.9	6.1	8.0	8.1	8.2	28.6	28.9	28.1	51.9	52.9	52.1
					28.3		28.4		29.1		52.6		52.7		52.3	
结论	所检验项目均符合GB175-2007中的P.O42.5标准要求。															
备注																

批准:

曾月

审核:

杨进军

检验:

何瑞

砂 检验 报告

报告编号:

S20250706

样品编号	S1204				取样日期	2025年07月4日		温州市建联建材有限公司 试验室 (盖章) 试验室								
类型	机制砂		规格		中砂		检验起始日期			2025年07月4日						
产地	益航贸易砂石场					报告日期				2025年07月6日						
检验依据	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52-2006					代表批量(t)				600						
颗 粒 级 配																
筛孔尺寸 (mm)		4.75	2.36	1.18	0.60		0.300		0.150		细度模数 (μ _f)	2.9				
级配区	I 区	10-0	35-5	65-35	85-71		95-80		100-90		规格	中砂				
	II 区	10-0	25-0	50-10	70-41		92-70		100-90							
	III 区	10-0	15-0	25-0	40-16		85-55		100-90		级配区	II 区				
累计筛余 (%)		4	25	45	62		77		92							
项 目	表观密度 (kg/m³)	松散堆积密度 (kg/m³)	空隙率 (%)	MB值	石粉含量 (%)				泥块含量 (%)			大于 10.0mm 的颗粒 (%)	氯离子含量 (%)			
技术要求					混凝土强度等级	≥C60	C55-C30	≤C25	≥C60	C55-C30	≤C25		钢筋混凝土	预应力混凝土		
					MB < 1.4	≤5.0	≤7.0	≤10.0	≤0.5	≤1.0	≤2.0				≤0.06	≤0.02
					MB ≥ 1.4	≤2.0	≤3.0	≤5.0								
检验结果	2620	1550	41	0.5	0.3				0.2			0	0.003			
结 论	所检验项目均符合《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52-2006标准要求。															
备 注																

批准:

曾月

审核:

杨进军

检验:

何瑞

石 检 验 报 告

报告编号: G20250704

样品编号	G1204			取样日期	2025年07月4日			扬州市建联建材有限公司 试验室 （盖章）								
公称粒级(mm)	5-31.5			检验起始日期	2025年07月4日											
产 地	益航贸易砂石场			报告日期	2025年07月6日											
类型	碎石			代表批量(L)	600											
检验依据	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52-2006															
颗 粒 级 配																
筛孔尺寸 (mm)	37.5		31.5		26.5		19.0		16.0		9.5		4.75		2.36	
标准值 (%)	0		0~5		--		15~45		—		70~90		90~100		95~100	
实际累计筛余 (%)	0		4		24		44		62		82		100		100	
项 目	表观密度 (kg/m³)	松散堆积 空隙率 (%)	含泥量 (%)			泥块含量 (%)			针片状颗粒总含量 (%)			压碎指标 (%)				
技术要求	—	—	≥C60	C55- C30	≤C25	≥C60	C55- C30	≤C25	≥C60	C55- C30	≤C25	岩石各种类		沉积岩或变质岩或卵石		
			≤0.5		≤1.0	≤2.0	≤0.2	≤0.5	≤0.7	≤8	≤15	≤25	混凝土强度等级			
													C60-C40			
检验结果	2720	43	0.3			0.2			4.6			8.3				
结 论	所检验项目均符合《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52-2006标准要求。															
备 注																

批准:

曾有

审核:

杨国军

检验:

何瑞

混凝土外加剂检验报告

报告编号: WJ20250706

样品编号	WJ1108	取样日期	2025年07月8日	
名称及类型	JN-ESB缓凝型高性能减水剂	检验日期	2025年07月8日	
生产厂家	广州市佳能工程材料有限公司	报告日期	2025年08月6日	
掺量 (%)	2.3	出厂日期	2025年11月7日	
产品批号	JN-2021-A135	代表批量 (t)	50	
检验依据	《混凝土外加剂》GB 8076-2008 《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T 8077-2012			
检验项目		控制指标		检验结果
pH值		5±1		6
含固量 (%)		6.75-10.45		9.1
水泥净浆流动度 (mm)		≥180		200
水泥胶砂减水率 (%)		≥20		20
(混凝土) 减水率 (%)		≥25		26.1
凝结时间之差 (min)	初凝	-90~120		60
	终凝	-90~120		60
抗压强度比 (%)	1d	170		185
	3d	160		175
	7d	150		160
	28d	140		150
结 论		所检验项目均符合GB 8076-2008 混凝土外加剂指标值。		
备 注				

批准: 曾育 审核: 杨海军 检验: 何瑞

4、钢筋合格证



柳州钢铁股份有限公司
LIUZHOU IRON & STEEL COMPANY LIMITED

产品质量证明书

QUALITY CERTIFICATE OF PRODUCT

地址：中国广西柳州北雀路117号
ADD: 117 BEIQUER ROAD, LIUZHOU, GUANGXI, CHINA
销售电话 (TEL): 0772-2592278/23610/6272
售后服务 (TEL): 0772-2592132
传 真 (FAX): 0772-2592784

收货单位 (PURCHASER):	广西洋行钢铁有限公司		证书编号 (CERTIFICATE NO.):	DW2025101029030											
订货单位 (CUSTOMER):	广西洋行钢铁有限公司		合同编号 (CONTRACT NO.):												
产品名称 (PRODUCT):	热轧带肋钢筋		装车单号 (LOADING NO.):	N31214A571											
标准 (SPECIFICATION):	GB/T1499.2-2018		车号涂色 (TRAIN NO. & COLOR):												
牌号及交货状态 (STEEL GRADE & DELIVERY CONDITION):	HRB400E 热轧态		发货日期 (DEPARTURE DATE):	20251010											
生产日期 Production Date	炉批号 Heat and Batch No.	规格 Size mm	捆数 Bundle	重量 Weight t	化学成分 Chemical Composition (%) (1=x10 ⁻¹ , 2=x10 ⁻² , 3=x10 ⁻³ , 4=x10 ⁻⁴ , 5=x10 ⁻⁵)	力学性能 Mechanical Property									
					C Si Mn P S V Ni Cr Mo Cu Ceq	屈服强度 Y.S Rel	抗拉强度 T.S Rm	伸长率 EI A	Agt	强屈比 R ^m /R ^{el} e1	特征值之比 R ^m /R ^{el} e1/Rel	弯曲 Bend 180° D=4a	反弯 R.R. 正90.反20 D		
20190730	19B20628801	Φ32×12000	19	52.668	24 53 1.89 30 20 33 1 3 0 3 49	485/485	645/645	%	%	1.3/1.3	1.21/1.21	合格/合格			
合计 Total			19	52.668	精度级别 (PRECISION GRADE):										
备注 (Notes)	1、本证书所列产品按标准合同规定检验判定合格。2、经销商打印或复印本证书须加盖经销商的印章，并与相关发货凭证对应使用方可有效。3、禁止篡改、伪造本证书，否则追究法律责任。4、尺寸(合格)、表面质量(合格)、晶粒度(合格)、疲劳试验(合格)。1.The products herein are qualified by testing and judging according to the standard contract. 2.The certificate printed or copied by the dealers will be valid if the red cap shall be sealed by the dealers and used in accordance with the relevant shipping documents.3.No tampering and forgery to this certificate otherwise be investigated for legal responsibility.4.Size(Qualified), Surface Quality(Qualified), Grain Size(Q), Fatigue Test(Q).													 生产许可证: XK05-001-00169	
